발 주 처	㈜스타필드 수원	대유평근린공원 주차장 신축공사	책 임 감 리 원	
착 공	2021 년 06 월 30일		시 공 사	韓進重工業
준 공	2023 년 01 월 31일			

MILESTONE

구 분	연 도 별	2021년							2022년												2023년	비고
	월 별	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	
	M+ 개월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Milestone	581	21-06-30	23-01-31
착공일	0	21-06-30	
1단계 준공일	0		22-03-30
준공일	0		23-01-31
공사준비/인허가	549	21-06-30	22-12-30
착공준비(인허가,착공신고 등)	42	21-06-30	21-08-10
가설공사(가설사무실,가설휀스,세륜기 등)	41	21-07-01	21-08-10
부지정리	20	21-08-11	21-08-30
도로인허가(1단계 준공)	5	22-03-26	22-03-30
사용승인	10	22-12-21	22-12-30
1단계공사	207	21-08-31	22-03-25
토공사	207	21-08-31	22-03-25
흙막이공사	92	21-08-31	21-11-30
CIP+제거식어스앵커	92	21-08-31	21-11-30
CIP설치	31	21-08-31	21-09-30
E/A설치(1단)	5	21-10-12	21-10-16
E/A설치(2단)	5	21-10-27	21-10-31
E/A설치(3단)	5	21-11-11	21-11-15
E/A설치(4단)	5	21-11-26	21-11-30
차수공사	25	21-09-10	21-10-04
SGR공법	25	21-09-10	21-10-04
토공사/부대토목	176	21-10-01	22-03-25
굴착공사	71	21-10-01	21-12-10
1단굴착	11	21-10-01	21-10-11
2단굴착	10	21-10-17	21-10-26
3단굴착	10	21-11-01	21-11-10
4단굴착	10	21-11-16	21-11-25
잔여굴착	10	21-12-01	21-12-10
부대토목	105	21-12-11	22-03-25
GSD수위제어시스템 설치	5	21-12-11	21-12-15
도로포장공사	33	22-02-21	22-03-25
기초공사	7	21-12-16	21-12-22
기초Con'c타설	7	21-12-16	21-12-22
골조공사	60	21-12-23	22-02-20
지하2층 골조(지하1 중바닥타설)	29	21-12-23	22-01-20
지하1층 골조(지상1 중바닥타설)	31	22-01-21	22-02-20
2단계공사	270	22-03-26	22-12-20
토공사	270	22-03-26	22-12-20
흙막이공사	116	22-03-26	22-07-19
흙막이절개	6	22-03-26	22-03-31
CIP+제거식어스앵커	96	22-04-01	22-07-05
CIP설치	50	22-04-01	22-05-20
E/A설치(1단-4단)	45	22-05-22	22-07-05
RSR	110	22-04-01	22-07-19
후열말뚝+전열말뚝(CIP)시공	40	22-04-01	22-05-10
1단레이커피장+콘크리트블럭시공	7	22-06-10	22-06-16
1단레이커설치	7	22-06-17	22-06-23
2단레이커피장설치	7	22-07-06	22-07-12
2단레이커설치	7	22-07-13	22-07-19
차수공사	25	22-04-11	22-05-05
SGR공법	25	22-04-11	22-05-05
토공사/부대토목	214	22-05-21	22-12-20
굴착공사	71	22-05-21	22-07-30
1단굴착	20	22-05-21	22-06-09
2단굴착	15	22-06-21	22-07-05
잔여굴착	15	22-07-16	22-07-30
부대토목	143	22-07-31	22-12-20
GSD수위제어시스템 설치	3	22-07-31	22-08-02
우수/오수공사	20	22-10-16	22-11-04
포장공사	62	22-10-20	22-12-20
기초공사	7	22-08-03	22-08-09
기초Con'c타설	7	22-08-03	22-08-09
골조공사	107	22-08-10	22-11-24
지하층 골조	67	22-08-10	22-10-15
지하2층 골조(지하1 중바닥타설)	32	22-08-10	22-09-10
지하1층 골조(지상1 중바닥타설)	35	22-09-11	22-10-15
지상층 골조	40	22-10-16	22-11-24
지상1층,지붕층 골조	20	22-10-16	22-11-04
기타 구조물공사	20	22-11-05	22-11-24
마감공사	92	22-09-15	22-12-15
방수공사	20	22-09-15	22-10-04
조적공사	20	22-10-05	22-10-24
미장공사	20	22-10-25	22-11-13
타일공사	20	22-10-25	22-11-13
기타마감공사	32	22-11-14	22-12-15
전기/통신/기계/소방공사	360	21-12-23	22-12-17
전기/통신/기계/소방공사	330	21-12-23	22-11-17
시운전	30	22-11-18	22-12-17
조경공사	62	22-10-20	22-12-20
조경식/식재/구조물공사	62	22-10-20	22-12-20

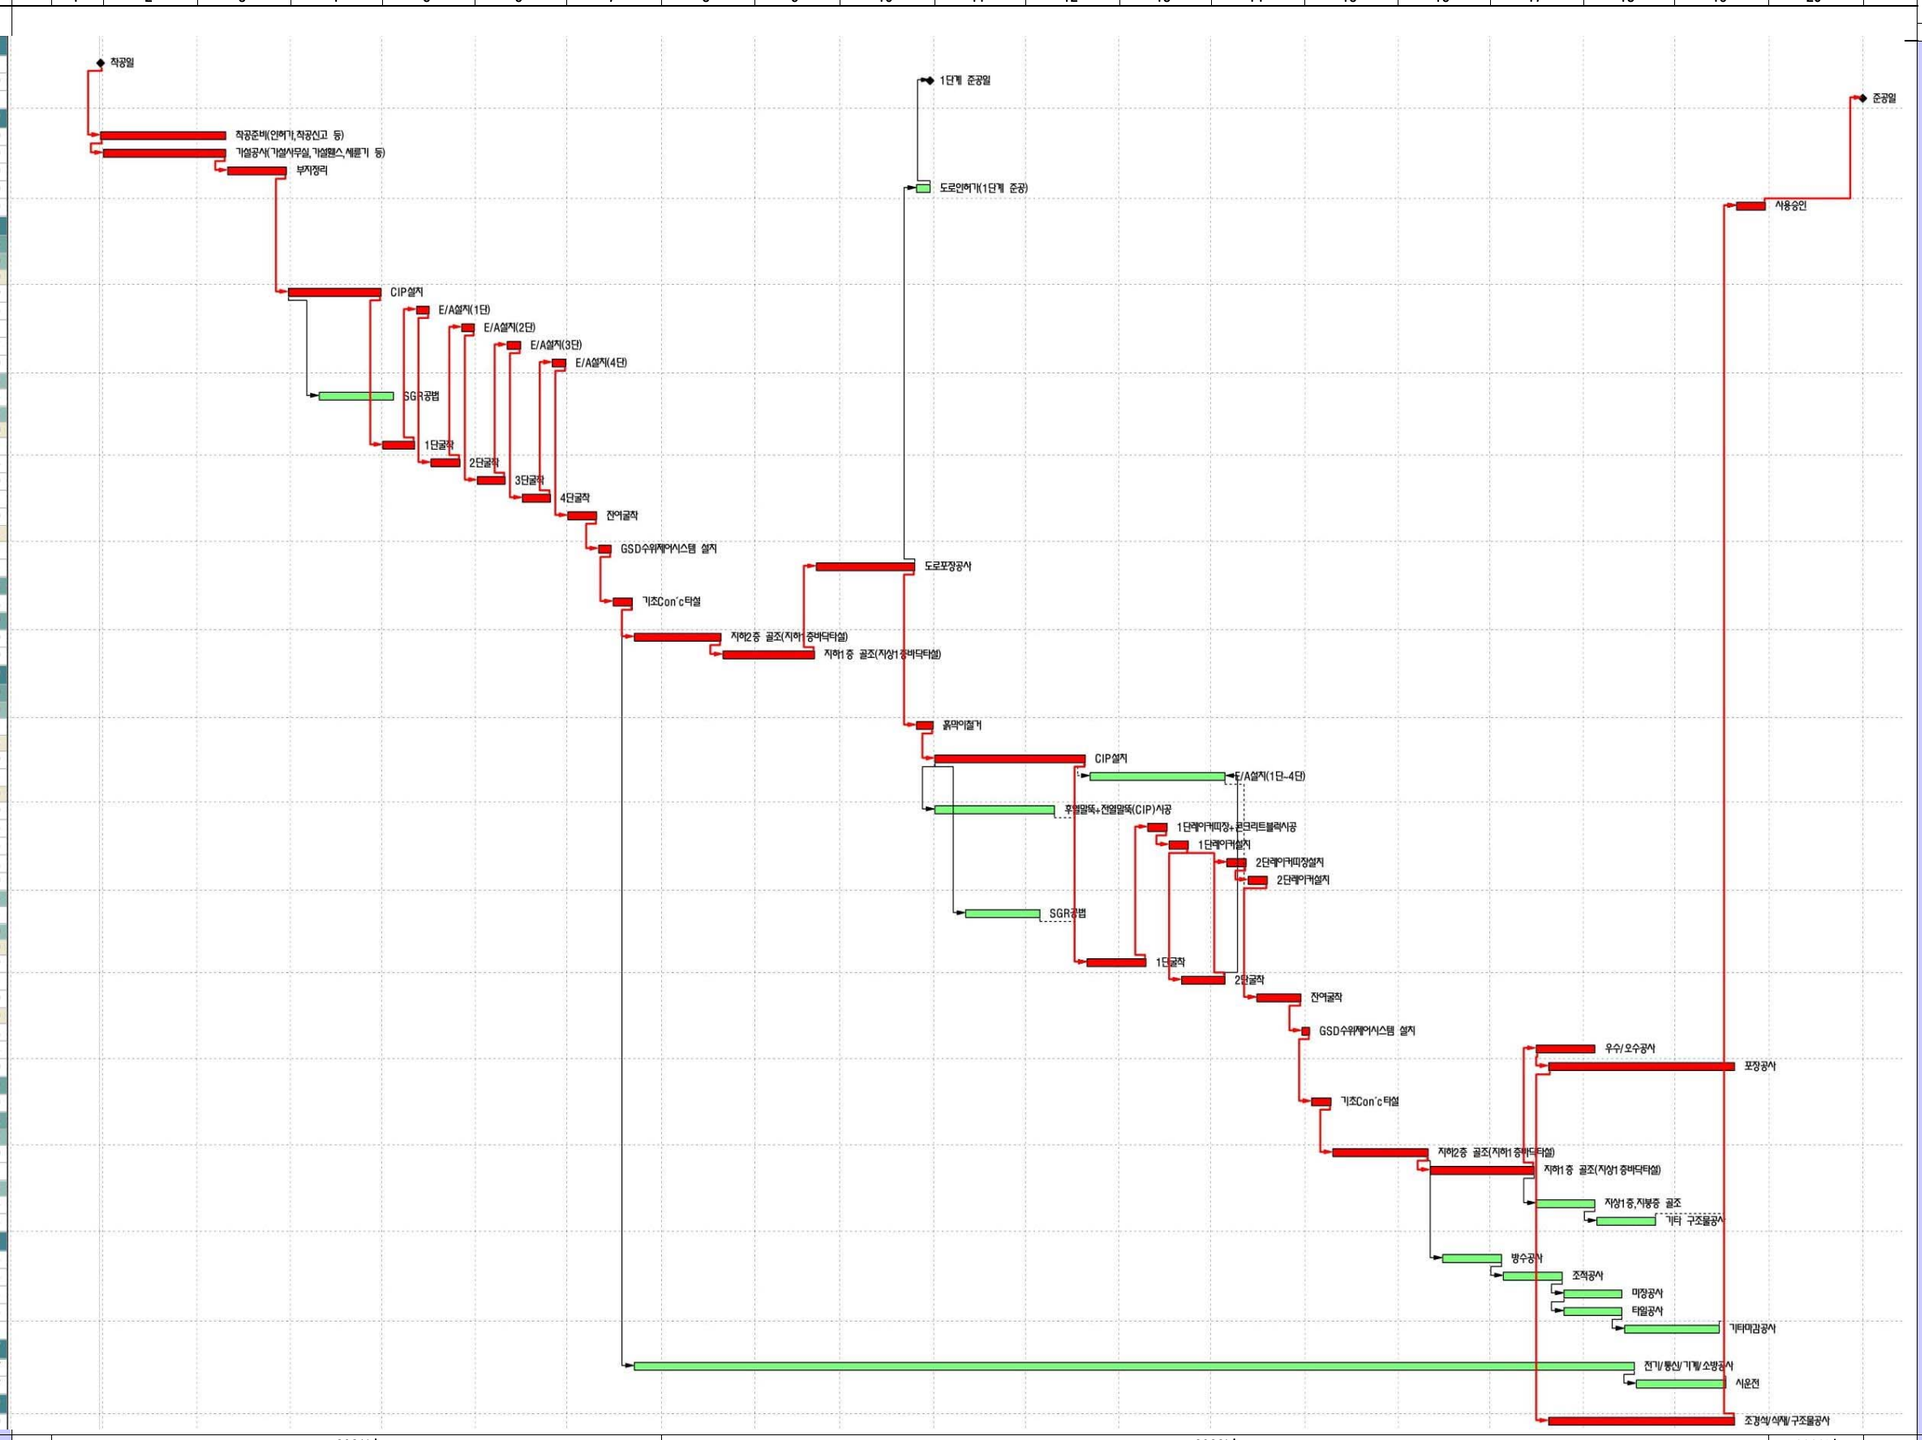

기 간		2021년							2022년												2023년	비고
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	
공정율	당 기	0.01	0.59	0.50	1.00	1.70	2.60	3.80	5.40	6.80	8.40	9.30	9.90	9.90	9.20	8.50	6.80	5.40	5.90	4.30	0.00	
	누 계	0.01	0.60	1.10	2.10	3.80	6.40	10.20	15.60	22.40	30.80	40.10	50.00	59.90	69.10	77.60	84.40	89.80	95.70	100.00	100.00	
